

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



RELATÓRIO PLANO DE OBRAS
1º QUADRIMESTRE DE 2023

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 29/04/2023.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
 - a. Todo dado indicado de % *financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento Econômico Financeiro.
 - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
 - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
 - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 6 OBRAS

1	LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL	EM OBRA BLOCO CRIMINAL	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 63.250.788,89	ALERTA
	Emissão OES	março, 2020	
	Data prevista conclusão	junho, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	39	
	Prazo decorrido de execução (meses)	37	
	% físico realizado	43,15%	
	Medição realizada	11ª / 20	
	Financeiro realizado	R\$ 27.293.825,90	
	Saldo a pagar	R\$ 35.956.962,99	
	Termo de Recebimento		

2	AMPÉRE - PADRÃO 1800	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 6.610.937,15	ATRASADO
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão	junho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	31	
	Prazo decorrido de execução (meses)	42	
	% físico realizado	41,83%	
	Medição realizada	11ª / 14	
	Financeiro realizado	R\$ 2.765.637,88	
	Saldo a pagar	R\$ 3.845.299,27	
	Termo de Recebimento		

3	FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 45.199.004,14	ATRASADO
	Emissão OES	outubro, 2020	
	Data prevista conclusão	abril, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	29	
	Prazo decorrido de execução (meses)	30	
	% físico realizado	72,97%	
	Medição realizada	13ª / 18	
	Financeiro realizado	R\$ 32.980.715,30	
	Saldo a pagar	R\$ 12.218.288,84	
	Termo de Recebimento		


4	CORBÉLIA - PADRÃO 1500	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 9.394.656,50	ATRASADO
	Emissão OES	novembro, 2021	

Data prevista conclusão	janeiro, 2023
Prazo previsto execução (meses)	13
Prazo decorrido de execução (meses)	16
% fisico realizado	8,20%
Medição realizada	3ª / 13
Financeiro realizado	R\$ 770.114,88
Saldo a pagar	R\$ 8.624.541,62
Termo de Recebimento	

5	NOVA AURORA - PADRÃO 1500	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 10.382.432,41	ALERTA
	Emissão OES	agosto, 2022	
	Data prevista conclusão	agosto, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	8	
	% fisico realizado	25,97%	
	Medição realizada	5ª / 12	
	Financeiro realizado	R\$ 2.696.395,13	
	Saldo a pagar	R\$ 7.686.037,28	
	Termo de Recebimento		

6	TERRA RICA - PADRÃO 1500	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 11.198.000,00	OK
	Emissão OES	outubro, 2022	
	Data prevista conclusão	outubro, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	6	
	% fisico realizado	15,06%	
	Medição realizada	3ª / 12	
	Financeiro realizado	R\$ 1.685.888,89	
	Saldo a pagar	R\$ 9.512.111,11	
	Termo de Recebimento		

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:

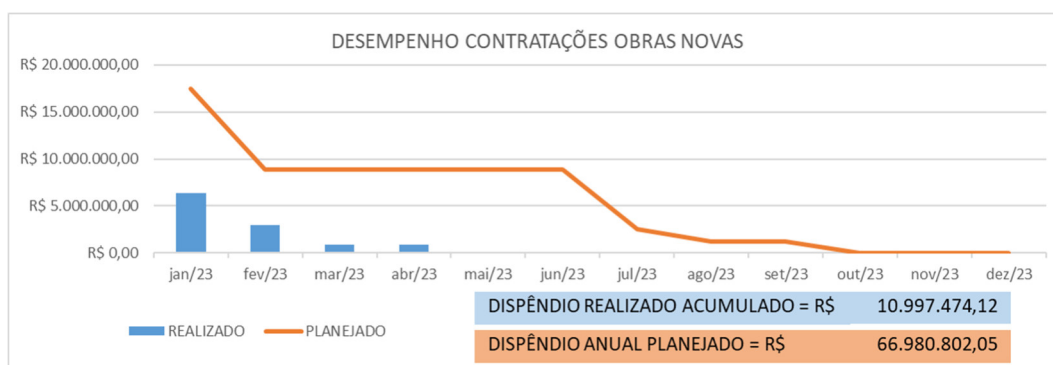

1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.

1	BELA VISTA DO PARAÍSO	Construção Fórum Novo
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 8.156.223,56
	Contratado	CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA
	Emissão OES	maio, 2018
	Data prevista conclusão	setembro, 2019
	Prazo previsto execução (meses)	16
	Prazo decorrido de execução (meses)	27 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	100,00%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Março, 2020
		Definitivo programado sem programação
	Inauguração/Ocupação	janeiro, 2021
	Conclusão	

2	CURITIBA - PRÉDIO ANEXO	EM OBRA SONORIZAÇÃO PRÉDIO ANEXO
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 4.953.726,74
	Contratado	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	Emissão OES	outubro, 2019
	Data prevista conclusão	maio, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	6
	Prazo decorrido de execução (meses)	36 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	96,78%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Outubro, 2021
		Definitivo programado sem programação
	Inauguração/Ocupação	outubro, 2021
	Conclusão	

1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 1 OBRAS

1	CAMPO MOURÃO (USINA FOTOVOLTAICA)	CONSTRUÇÃO USINA
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 31.128.217,46
	Início da licitação	junho, 2022
	Fase atual	Em licitação

1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 22 PROJETOS

1	MARINGÁ - PROJETOS	LICITAÇÃO NOVO FÓRUM 0097510-68.2022 TRD 7990187	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 899.994,58	ATRASADO
	Contratado	GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	46	
	Prazo decorrido de execução (meses)	51	
	Previsão de conclusão	agosto, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	3
	% financeiro realizado consolidado	93,61%	
	Saldo a pagar	R\$ 57.548,84	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	MARINGÁ - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 199.633,89	93,75%

2	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 4.981.060,31	ALERTA
	Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES	junho, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	56	
	Prazo decorrido de execução (meses)	55	
	Previsão de conclusão	fevereiro, 2023	
	% físico realizado	Fases previstas	6
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	45,06%	
	Saldo a pagar	R\$ 2.736.638,22	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO		
	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 1.077.349,70	39,63%

3	COLOMBO - PROJETOS	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 457.187,55	ATRASADO
	Contratado	SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME	
	Emissão OES	dezembro, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	36	
	Prazo decorrido de execução (meses)	37	
	Previsão de conclusão	dezembro, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5

	Fases recebidas	2
% financeiro realizado consolidado	85,53%	
Saldo a pagar	R\$ 66.169,80	
% financeiro não consolidado (se houver)		
COLOMBO - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
	R\$ 114.800,00	40,00%

4	PONTA GROSSA - PROJETOS	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 784.739,75	ATRASADO
	Contratado	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES (reinício de contrato)	outubro, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	26	
	Prazo decorrido de execução (meses)	27	
	Previsão de conclusão	dezembro, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	74,87%	
	Saldo a pagar	R\$ 197.184,94	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 164.800,00	62,00%

5	CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000		
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 447.447,00	
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
	Emissão OES	julho, 2020	
	% físico realizado	Fases previstas	13
		Fases recebidas	3
	% financeiro realizado consolidado	24,70%	
	Saldo a pagar	R\$ 336.927,59	
	% financeiro não consolidado (se houver)		

6	CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	30	
	Previsão de conclusão	fevereiro, 2021	
7	PARANAÍ - PADRÃO 10.000	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	30	
	Previsão de conclusão	fevereiro, 2021	
8	UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	ATRASADO

Prazo previsto execução (meses)	7
Prazo decorrido de execução (meses)	30
Previsão de conclusão	fevereiro, 2021

NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1500			
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 397.624,71		
Contratado	JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME		
Emissão OES	fevereiro, 2021		
% físico realizado	Fases previstas	34	
	Fases recebidas	7	
% financeiro realizado consolidado	75,88%		
Saldo a pagar	R\$ 95.900,16		
% financeiro não consolidado (se houver)			
9	JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	18		
Prazo decorrido de execução (meses)	22		
Previsão de conclusão	setembro, 2022		
10	BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	18		
Prazo decorrido de execução (meses)	22		
Previsão de conclusão	setembro, 2022		
11	MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500	EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 8481294	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	18		
Prazo decorrido de execução (meses)	22		
Previsão de conclusão	setembro, 2022		

JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLORADO, PRUDENTÓPOLIS, SÃO MATEUS DO SUL, LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800			
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 208.999,00		
Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME		
Emissão OES	julho, 2021		
% físico realizado	Fases previstas	10	
	Fases recebidas	1	
% financeiro realizado consolidado	9,85%		
Saldo a pagar	R\$ 188.412,60		
% financeiro não consolidado (se houver)			
12	JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
Emissão OES	julho, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	12		
Prazo decorrido de execução (meses)	18		

	Previsão de conclusão	julho, 2022	
13	PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2021	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	18	
	Previsão de conclusão	julho, 2022	
14	QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2021	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	10	
	Prazo decorrido de execução (meses)	18	
	Previsão de conclusão	maio, 2022	
15	LOANDA - PADRÃO 1800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2021	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	11	
	Prazo decorrido de execução (meses)	18	
	Previsão de conclusão	junho, 2022	
16	MARIALVA - PADRÃO 1800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2021	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	18	
	Previsão de conclusão	julho, 2022	
17	SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2021	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	13	
	Prazo decorrido de execução (meses)	18	
	Previsão de conclusão	agosto, 2022	
18	COLORADO - PADRÃO 1800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Emissão OES	julho, 2021	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	11	
	Prazo decorrido de execução (meses)	18	
	Previsão de conclusão	junho, 2022	


19	CAMPO MOURÃO (USINA FOTOVOLTAICA)	EM LICITAÇÃO OBRA	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 0,00	ATRASADO
	Contratado	ST ELETRICIDADE	
	Emissão OES	janeiro, 1900	
	Prazo previsto execução (meses)	9	
	Prazo decorrido de execução (meses)	1476	
	Previsão de conclusão	janeiro, 1900	
	% físico realizado	Fases previstas	3
		Fases recebidas	
	% financeiro realizado consolidado	0,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 0,00	
	% financeiro não consolidado (se houver)	#DIV/0!	

20	CTBA - PRÉDIO ANEXO (AR COND.) FORA DA LOA 2022	COMPLEMENTARES CONTRATADOS CONTRATO SUSPENSO ATÉ FEV/2023	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 259.000,00	SUSPENSO
	Contratado	ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL LTDA – ME	
	Emissão OES	janeiro, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	0	
	Prazo decorrido de execução (meses)	36	
	Previsão de conclusão		
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	
	% financeiro realizado consolidado	15,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 220.150,00	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	CONTRATO SUSPENSO ATÉ FEV/2023		

21	CTBA - SEDE MAUÁ (AR COND.) FORA DA LOA 2022	COMPLEMENTARES CONTRATADOS CONTRATO SUSPENSO ATÉ FEV/2023	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 349.000,00	SUSPENSO
	Contratado	ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL LTDA – ME	
	Emissão OES	janeiro, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	0	
	Prazo decorrido de execução (meses)	36	
	Previsão de conclusão		
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	
	% financeiro realizado consolidado	15,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 296.650,00	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	CONTRATO SUSPENSO ATÉ FEV/2023		

22	CURITIBA - SEDE MAUÁ (USINA FOTOVOLTAICA)	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENETO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 23.485,00	OK
	Contratado	ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	Emissão OES	janeiro, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	2	
	Prazo decorrido de execução (meses)	0	
	Previsão de conclusão	10/03/2023	
	% físico realizado	Fases previstas	2
		Fases recebidas	
	% financeiro realizado consolidado	0,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 23.485,00	
	% financeiro não consolidado (se houver)	0,00%	


Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:

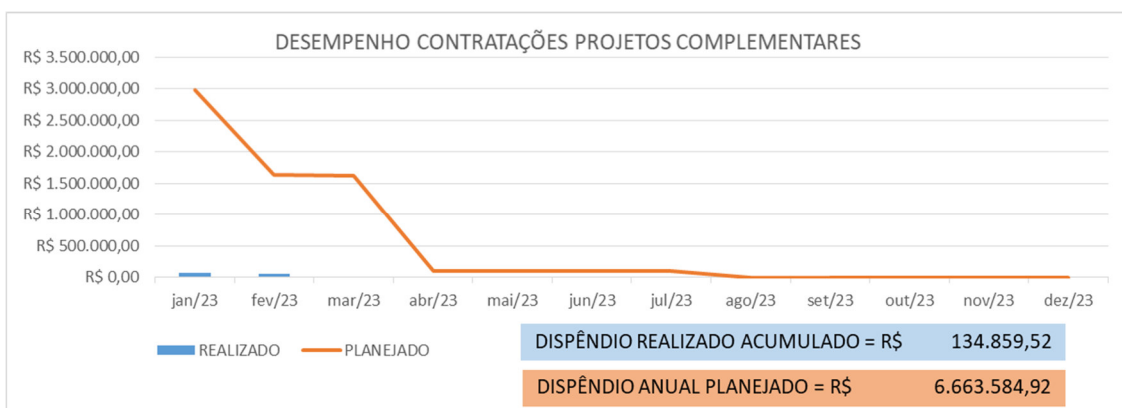


2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO		EMIÇÃO
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)		11/01/2023
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)		910
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)		724
	Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio	103
	Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio	59
	Idade média das construções (anos)	27,1
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB)		323.296,67
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)		35.010,56
ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso)		34.367,38
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)		392.674,61
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)		193.034,93
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR		585.709,54
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS		643.277,41
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS		128.193,64
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA		197.843,75
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA		969.314,80
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS	D	45
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS		15
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES		
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS		R\$ 760.826.100,17
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES		R\$ 1.093.585.423,59
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR		R\$ 1.854.411.523,76
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes		
NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR		
1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR		
	EM USO JUDICIÁRIO	SEM USO OU OUTROS USOS
FÓRUNS CENTRAIS	162	0
FÓRUNS ANTIGOS	2	46
IMÓVEIS 2	14	11
IMÓVEIS 3	8	4
IMÓVEIS 4	6	1
IMÓVEIS 5	4	0
IMÓVEIS 6	1	0
INTERIOR	A	C
TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO INTERIOR	197	62
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)		
2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA		
TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA	B	36
PRÓPRIOS (TJPR):	3	
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):	20	
LOCADOS AO TJPR:	13	
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):	2	
TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO	(A+B)	233
TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)	(A+B+C)	295
TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)	(D)	45
TOTAL GERAL DE UNIDADES	(A+B+C+D)	340

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE

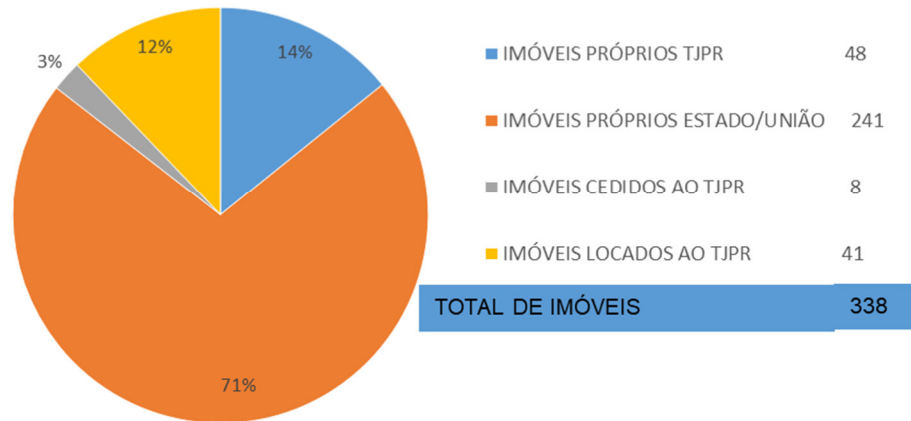

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO

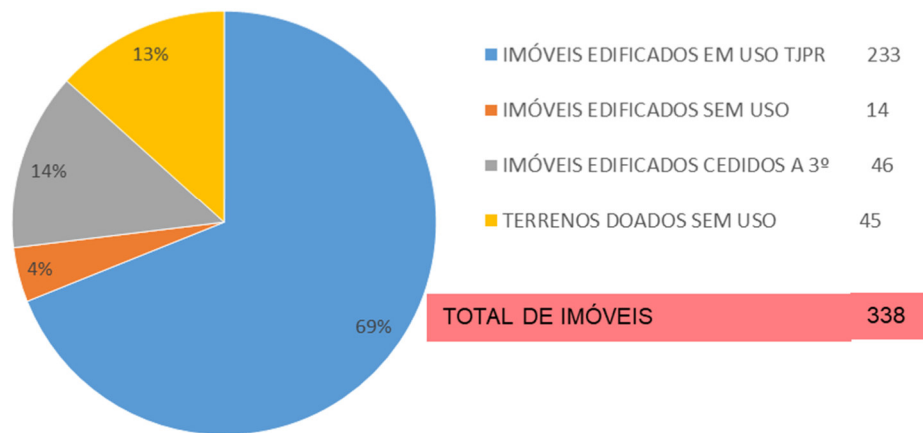

3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)


RELATÓRIO RANQUEAMENTO DE COMARCAS										EMIÇÃO
RANQUEAMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 114/2010 CNJ										11/01/2023
POSIÇÃO RANQUEAMENTO	COMARCAS	NOTA REFERENCIAL	SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL	HÁ OBRAS/SERVIÇO EM ANDAMENTO?	HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO?	FASE ATUAL	ÚLTIMA AÇÃO DE OBRA	ANO DA OBRA	TERRENO DOADO?	
1	NOVA AURORA	32	MUNICÍPIO	EM OBRA NOVO FÓRUM	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES ENTREGUES	2014-REPAROS 2018-SIST. SEGURANÇA	FÓRUM CENTRAL CEDIDO AO TJPR	TERRENO DOADO	
2	AMPÉRE	35	MUNICÍPIO	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA		2014-INST. ARCOND. 2014-REPAROS 2018-REPAROS	MOVEL CEDIDO AO TJPR PELA PREFEITURA MUNICIPAL	TERRENO DOADO	
3	CENTENÁRIO DO SUL	50	MUNICÍPIO	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	EM LICITAÇÃO COMPLEMENTARES	2018-INST. ARCOND. 2018-REF. ELÉTRICA 2018-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 887 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
4	COLOMBO	73	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO P6000	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2018-REF. ELÉTRICA 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 877 TRD 877 Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
5	QUATRO BARRAS	78	LOCADO	NADA CONSTA	NADA CONSTA		LOCADO	FÓRUM CENTRAL LOCADO	NÃO	
6	JAGUARIVÁ	80	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2018-REF. COBERTURA 2018-REF. INCLÍNIO 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 865 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
7	PAIÇANDU	93	LOCADO	NADA CONSTA	NADA CONSTA		LOCADO	FÓRUM CENTRAL LOCADO	NÃO	
8	MARINGÁ	117	ESTADO DO PARANÁ	LIÇÃO NOVO FÓRUM 00/785-483-202 TRD 799/87	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	COMPLEMENTARES CONTRATADOS RECEBIDOS TRD 799/87	2009-REF. AMPL. 2014-REPAROS GERAIS 2018-2019-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 866 TRD N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
9	BOCAÍVA DO SUL	122	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2018-REPAROS ELET. 2018-REPAROS ATA	FÓRUM CENTRAL N 878 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	NÃO	
10	PONTAL DO PARANÁ	156	MUNICÍPIO	EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 792/864	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES EM ANÁLISE PARA RECEBIMENTO	2014-INST. ARCOND. 2014-2018-REPAROS 2020-REPAROS ATA	MOVEL CEDIDO AO TJPR PELA PREFEITURA MUNICIPAL	TERRENO DOADO	
11	PARANGUÁ	154	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO ELEITO ADQUIRIDO LEGALIZAÇÃO	2018-REF. AMPL. 2018-REF. ELÉTRICA 2018-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 875 TRD 875 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	PROPOSTO	
12	CORBÉLIA	157	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA		2002-REF. AMPL. 2014-INST. ARCOND. 2018-REF. ELÉTRICA REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 877 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
13	IRATI	162	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO	LIÇÃO COMPLEMENTARES SUSPENSAS ATE 30/9/2023	2018-INST. CFTV 2018-REF. AMPL. 2020-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 867 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
14	CLEVLÂNDA	153	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	EM LICITAÇÃO COMPLEMENTARES	2018-INST. ARCOND. 2018-REPAROS 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 863 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
15	ANTONINA	170	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR	2018-INST. ARCOND. 2018-REPAROS 2018-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 863 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
16	MORRETES	174	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	TERRENO ELEITO ADQUIRIDO LEGALIZAÇÃO	2003-REF. AMPL. 2018-REF. ELÉTRICA 2018-REFORMA CONT. 2020-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 865 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	PROPOSTO	
17	PARANAVÁ	179	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DOA NOVO FÓRUM	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2004-REFORMA 2018-REFORMA 2018-2019-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 860 TRD 860 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
18	SANTO ANTONIO DA PLATINA	181	TJPR	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	LIÇÃO COMPLEMENTARES SUSPENSAS ATE 30/9/2023	2018-INST. ARCOND. 2018-REPAROS 2018-REFORMA E SONORIZAÇÃO	FÓRUM CENTRAL N 867 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
19	RIBERAÕ DO PINHAL	185	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	EM LICITAÇÃO COMPLEMENTARES	2004-REFORMA 2018-REFORMA 2018-2019-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 866 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
20	PIRAÍ DO SUL	185	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO ELEITO ADQUIRIDO LEGALIZAÇÃO	2006-REFORMA 2014-REF. INCLÍNIO 2018-REF. INCLÍNIO	FÓRUM CENTRAL N 863 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	PROPOSTO	
21	TELMAC DO BORBA	202	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DOA REFORMA E AMPLIAÇÃO	ESCOPO A DEFINIR PELA DIREÇÃO DOA	2018-REF. INST. ENERGIA 2018-REF. INST. ELÉTRICA 2020-REPAROS ATA	FÓRUM CENTRAL N 864 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
22	FRANCISCO BELTRÃO	210	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA		2018-REPAROS 2018-REFORMA 2018-INST. PLAT. DEF. REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 868 TRD 868 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
23	PRA OLARIA	210	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO	EM ANÁLISE TERRENOS	2018-INST. CENTRAL TELEF. 2018-INST. ARCOND. 2018-SIST. SOM	FÓRUM CENTRAL N 867 TRD 868 Expediente Obra 22/860/865 Expediente Projetos N/C	PROPOSTO	
24	SENGES	214	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	EM ANÁLISE NOVO TERRENO	2018-REFORMA 2018-REFORMA 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 866 TRD 869 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
25	URAI	214	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	EM LICITAÇÃO COMPLEMENTARES	2018-REF. AMPL. 2018-REF. ELÉTRICA 2018-INST. ARCOND. 2018-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 866 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
26	UNIAO DA VITÓRIA	223	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P6000	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2018-REPAROS 2018-REFORMA 2020-REPAROS ATA	FÓRUM CENTRAL N 867 TRD 867 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
27	FEABRIL	225	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 793/720	2001-REF. AMPL. 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 866 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
28	SARANDI	231	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DOA REFORMA E AMPLIAÇÃO	TERRENO LEGALIZADO ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR	2018-NOVO FÓRUM 2018-INST. ARCOND. 2018-REF. AMPL. 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 2004 TRD 2004 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	NÃO	
29	PITANGA	230	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	NADA CONSTA	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	2018-REF. AMPL. 2018-REFORMA 2018-2019-INST. ARCOND. 2018-ENTRADA ENERGIA	FÓRUM CENTRAL N 865 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
30	JAGUARITÁ	230	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	EM ANÁLISE TERRENOS	2018-INST. CENTRAL TELEF. 2018-INST. ARCOND. 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 866 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	PROPOSTO	
31	JANDAIA DO SUL	231	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2004-REF. AMPL. 2018-2019-REPAROS 2018-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 865 TRD 865 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
32	MANDAGUAÍ	237	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	SOLICITAR A COMARCA OFERTA DE TERRENOS	2004-REF. AMPL. 2018-REFORMA 2018-INST. ARCOND. 2018-2019-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 877 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	NÃO	
33	SÃO JOÃO DO TRINFINO	252	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	SOLICITAR A COMARCA OFERTA DE TERRENOS	2018-REPAROS 2018-COBERTURA ESTAC. 2018-REPAROS 2020-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 864 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	NÃO	
34	TEXEIRA SOARES	264	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	SOLICITAR A COMARCA OFERTA DE TERRENOS	2018-REF. ACESSIBILIDADE 2018-REFORMA 2018-AD-AD-ENTRADA ENERGIA 2020-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 865 TRD 865 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	NÃO	
35	CÂNDIDO DE ABRU	271	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	2018-REPAROS 2018-REPAROS 2020-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 865 TRD 865 Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	PROPOSTO	
36	PRUDENTÓPOLIS	277	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2018-INST. ARCOND. 2018-REPAROS 2018-REF. INCL. E CFTV 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 868 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
37	SANTA MARIANA	276	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA		2002-REF. AMPL. 2002-REFORMA 2018-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 877 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	NÃO	
38	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	279	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO DOA REFORMA E AMPLIAÇÃO	TERRENO ELEITO ADQUIRIDO LEGALIZAÇÃO	2004-REF. AMPL. 2014-INST. ARCOND. 2018-REFORMA 2020-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 861 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	PROPOSTO	
39	MANDAGUAÇU	287	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR	2018-REF. ELÉTRICA 2018-REFORMA 2018-INST. ARCOND. 2018-REPAROS ATA	FÓRUM CENTRAL N 862 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	
40	MARALVA	293	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2014-REF. ENTR. ENERGIA 2018-REPAROS COBERTURA 2018-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 868 TRD 867 Expediente Obra 6.447/862 Expediente Projetos N/C	TERRENO DOADO	




4. DESEMBOLSOS TOTAIS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de **R\$ 14.618.092,91** correspondentes a **23,55 %** do valor inicialmente planejado de **R\$ 62.080.295,25** para o quadrimestre, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

	Desembolso nos meses do relatório	Desembolso acumulado no ano
Obras em execução ou em Recebimento	R\$ 10.997.474,12	R\$ 10.997.474,12
Projetos complementares	R\$ 134.859,52	R\$ 134.859,52
Manutenção e Atas	R\$ 4.596.780,09	R\$ 4.596.780,09
	R\$ 15.729.113,73	R\$ 15.729.113,73

4.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS

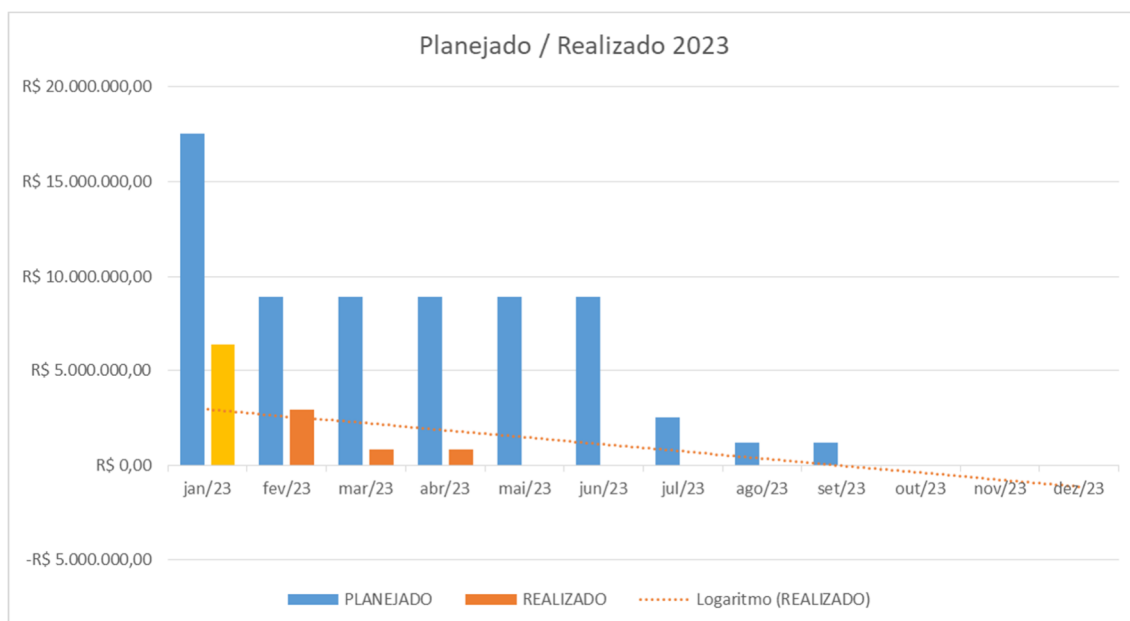

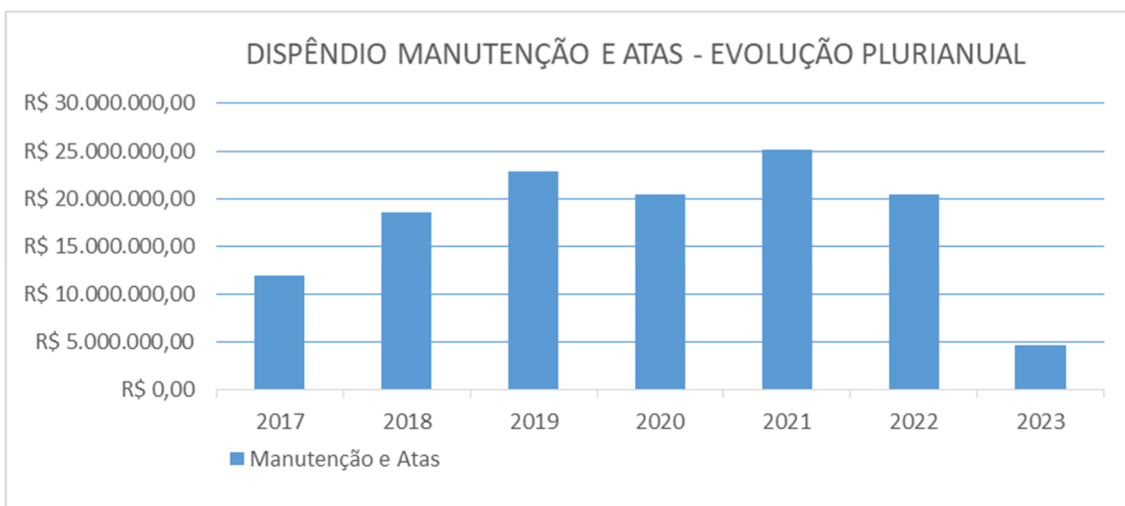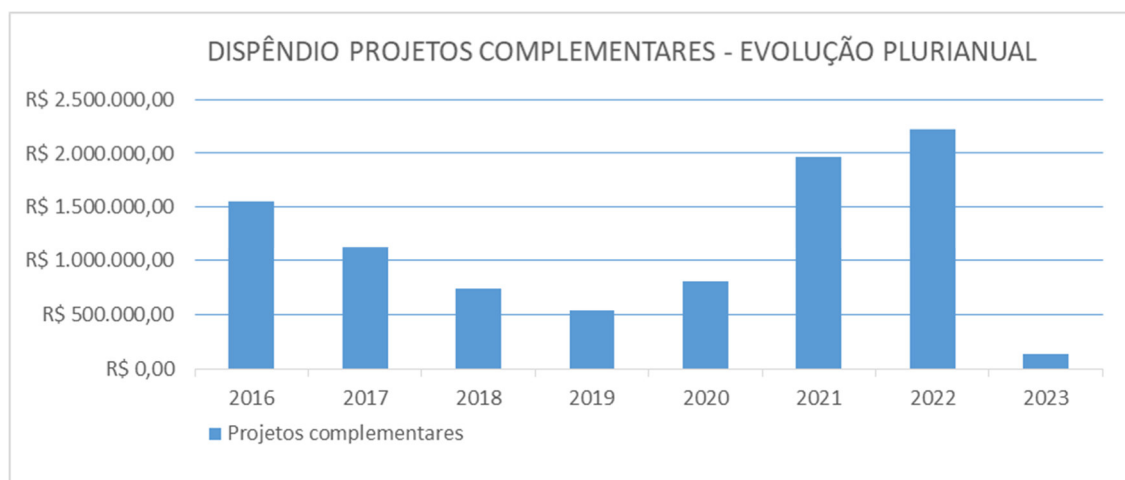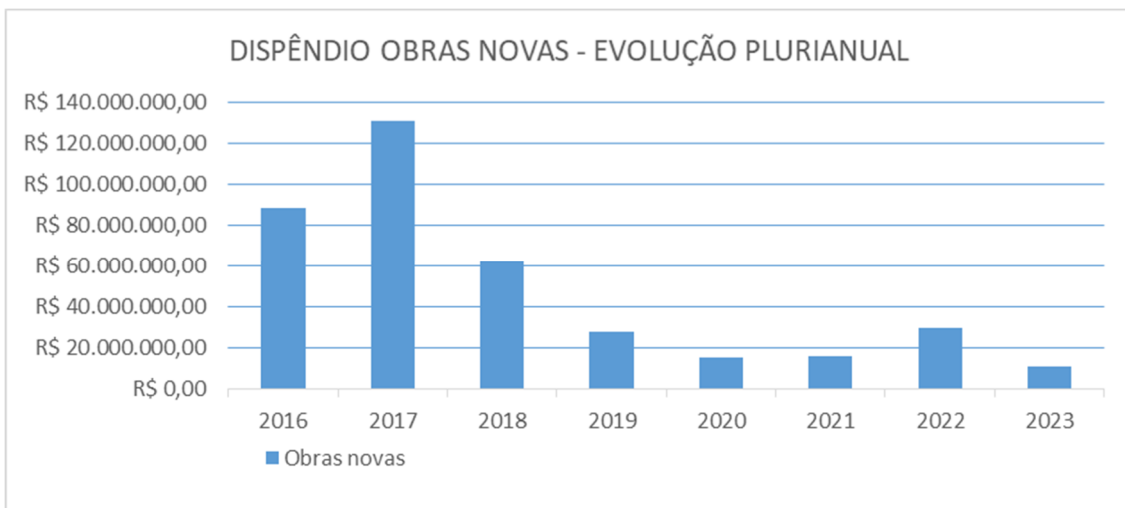


5. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

- Manutenção Elevadores
- Manutenção Ar condicionado
- Manutenção Geradores
- Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)
- Manutenção Sala Segura e Data Center
- Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia
- Ata de Instalação de Ar condicionado
- Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de **R\$ 4.596.780,09** e acumulado anual de **R\$ 4.596.780,09**, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

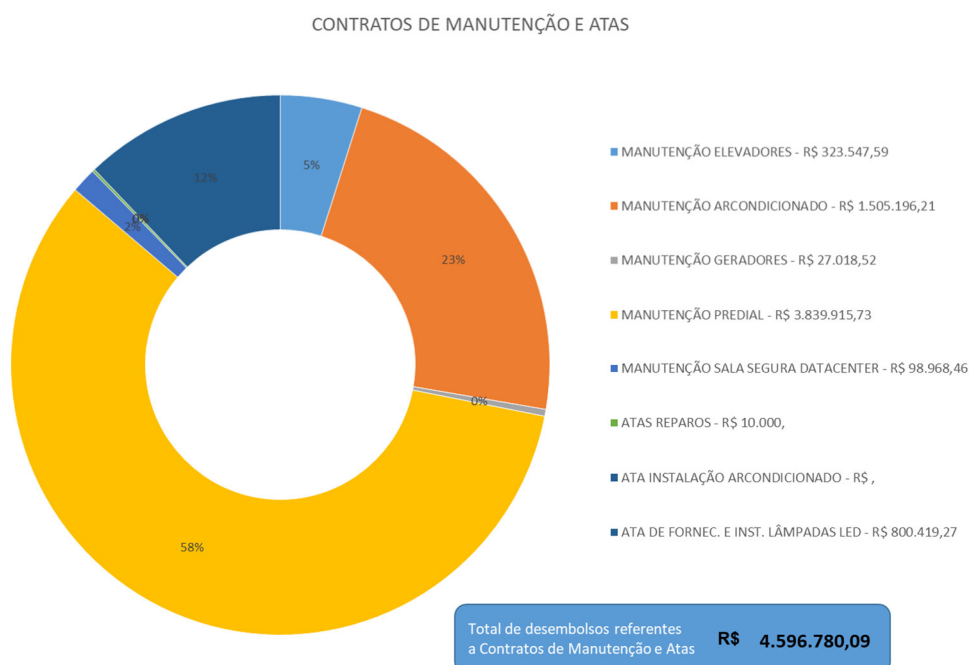

6. DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS


As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face à próximo esgotamento da vigência do contrato: **verde** (não necessita atenção), **amarelo** (final da vigência próximo) e **vermelho** (contrato vencido).

6.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2023	R\$ 510.487,83
Regional Oeste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2023	R\$ 140.515,56
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	04/11/2023	R\$ 154.415,75

Desembolso no período do Relatório	R\$ 323.547,59
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 323.547,59

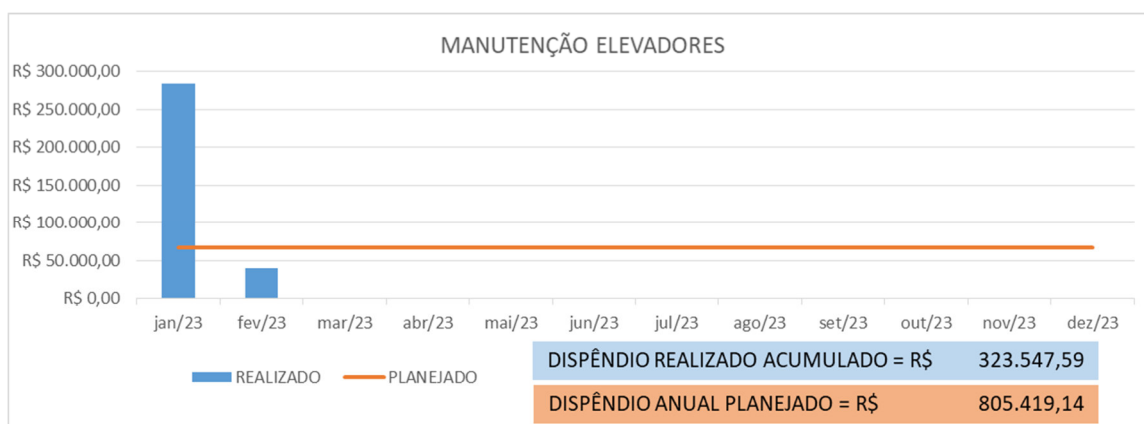


6.2 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	01/03/2024	R\$ 6.081.099,96

Desembolso no período do Relatório	R\$ 1.505.196,21
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 1.505.196,21

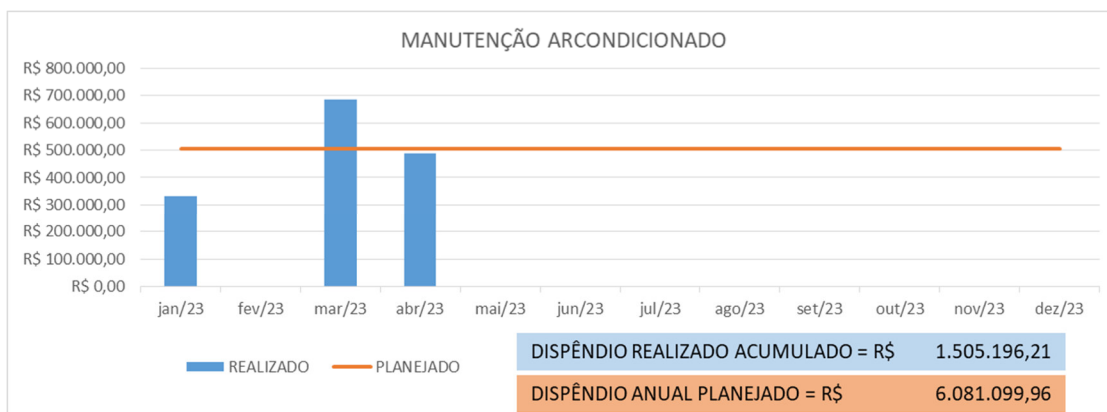


6.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paran , com fornecimento integral de pe as.

Destino	Contratado	Vig�ncia	Valor contrato
Paran� total	EFL SILVA MANUTEN�O DE NO-BREAKS E GERADORES - ME	18/08/2023	R\$ 81.055,56

Desembolso no per�odo do Relat�rio	R\$ 27.018,52
Desembolso acumulado no ano do Relat�rio	R\$ 27.018,52

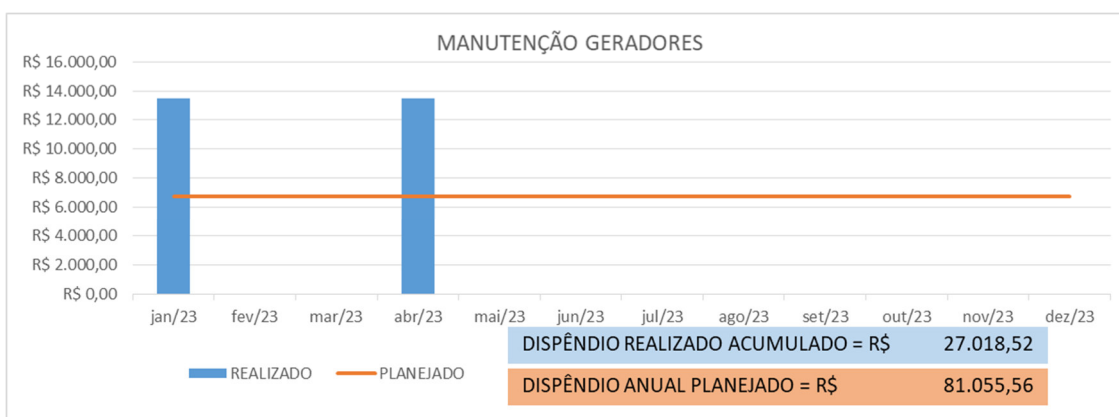


6.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços. Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	05/04/2023	R\$ 13.219.489,12

Desembolso no período do Relatório	R\$ 3.839.915,73
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 3.839.915,73

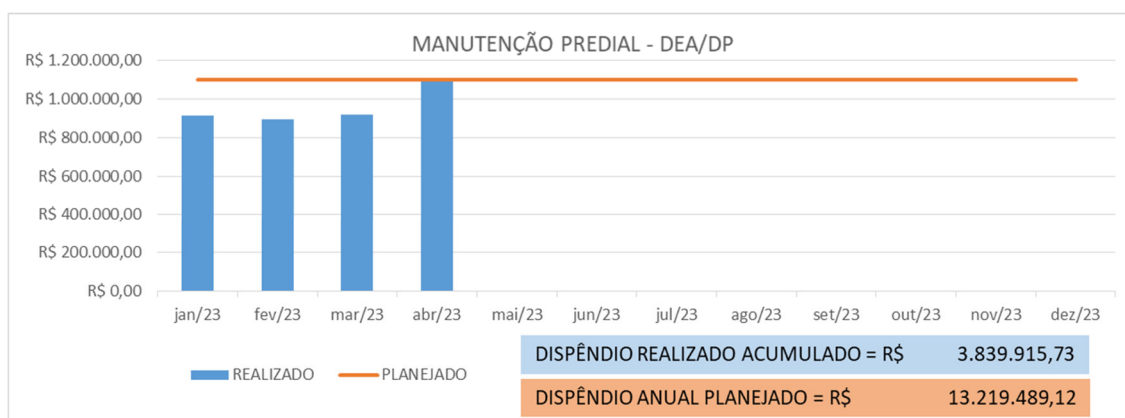

6.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER


Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	28/07/2023	R\$ 403.635,13

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos

seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.


Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	01/04/2023	R\$ 308.123,57
Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2)			R\$ 98.968,46
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2)			R\$ 98.968,46

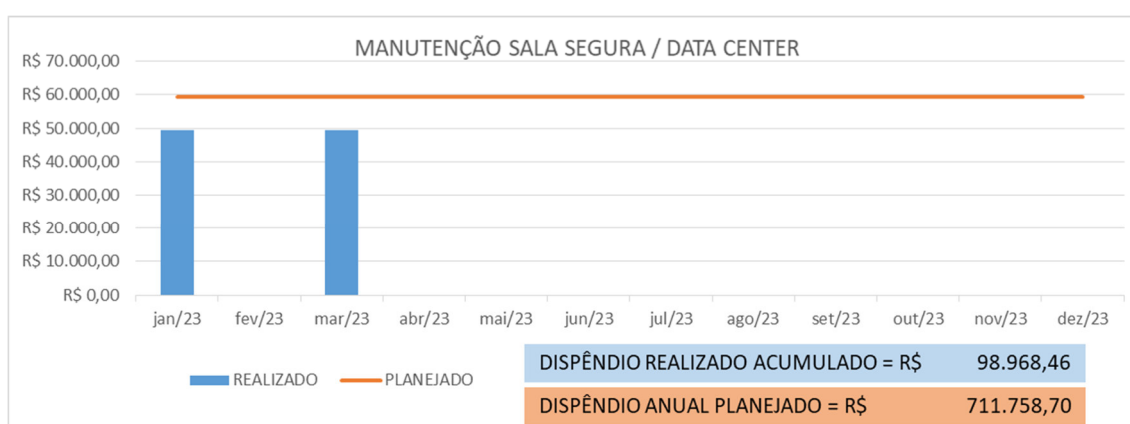

6.6 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Paraná total	ARBOM COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23/06/2023	R\$ 1.200.000,00
Desembolso no período do Relatório		R\$ 0,00	
Desembolso acumulado no ano do Relatório		R\$ 0,00	

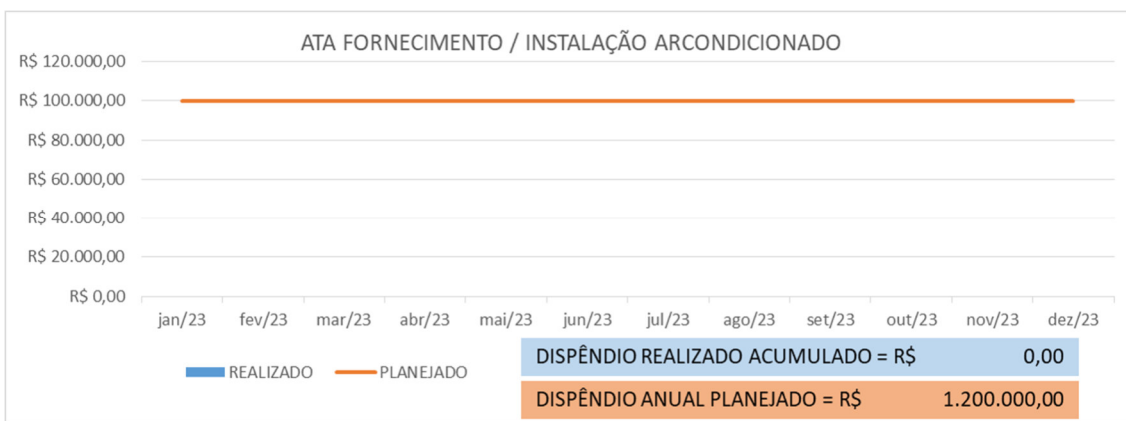

6.7 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED

Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação lâmpadas LED	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP	10/01/2023	R\$ 3.400.089,00

Desembolso no período do Relatório	R\$ 800.419,27
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 800.419,27

